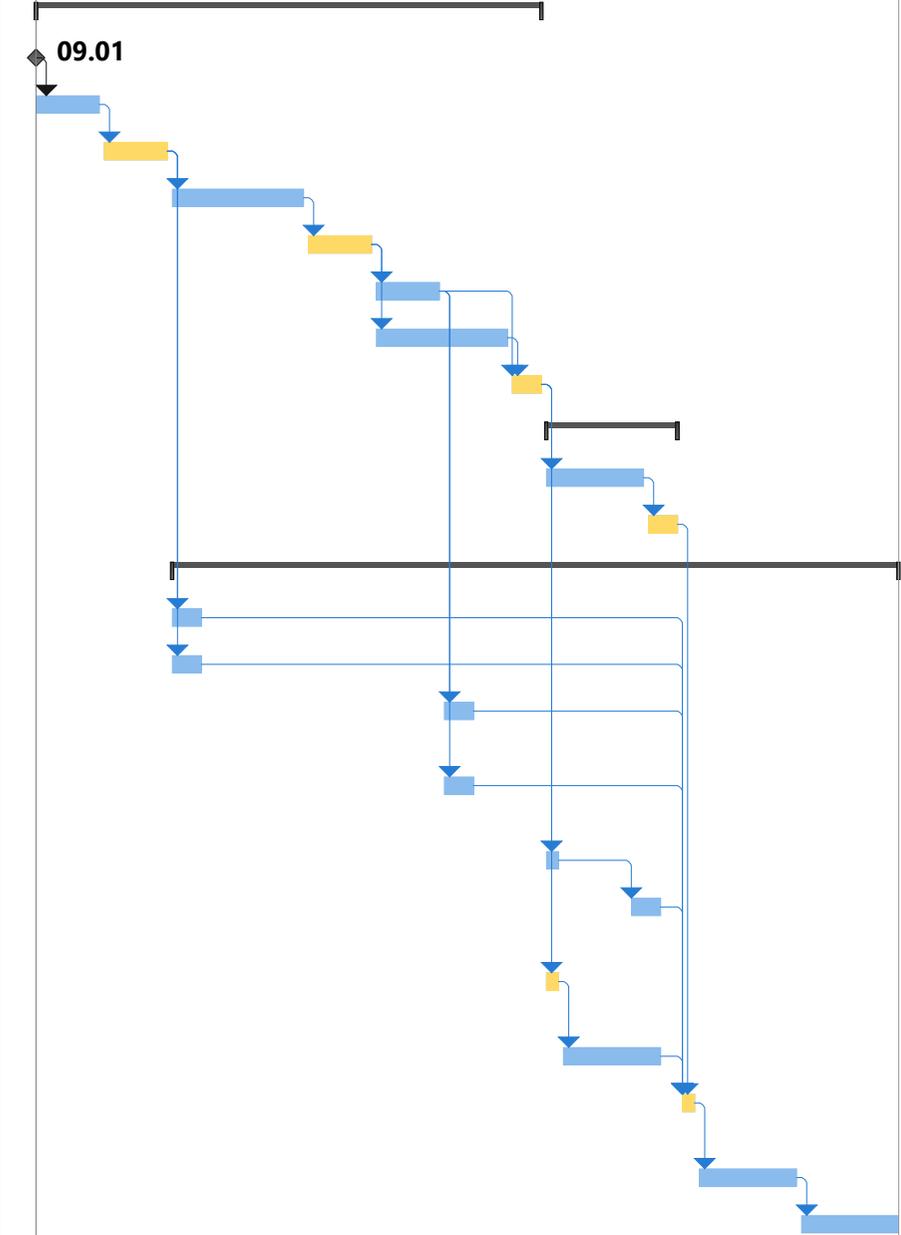


Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	9 Дек '17 23 Янв '18 27 Фев '18 03 Апр '18 08 Май '18 12 Июнь '18 17 Июль '18 21 Авг '18 25 Сен '18 30 Окт '18 04 Дек '18 08													
					С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П
1	1 Инвентаризация	150 дней	Пн 09.01.17	Пт 04.08.17														
2	1.1 Стартовая встреча и передача опросного листа	0 дней	Пн 09.01.17	Пн 09.01.17														
3	1.2 Визуальный осмотр промплощадок	20 дней	Пн 09.01.17	Пт 03.02.17														
4	1.3 Сбор исходных данных	20 дней	Пн 06.02.17	Пт 03.03.17														
5	1.4 Проведение инструментальных замеров	40 дней	Пн 06.03.17	Пт 28.04.17														
6	1.5 Согласование результатов замеров с Заказчиком	20 дней	Пн 01.05.17	Пт 26.05.17														
7	1.6 Расчет рассеивания	20 дней	Пн 29.05.17	Пт 23.06.17														
8	1.7 Составление Отчета об инвентаризации	40 дней	Пн 29.05.17	Пт 21.07.17														
9	1.8 Согласование инвентаризации с Заказчиком	10 дней	Пн 24.07.17	Пт 04.08.17														
10	2 Обосновывающие	40 дней	Пн 07.08.17	Пт 29.09.17														
11	2.1 Разработка обосновывающих документов	30 дней	Пн 07.08.17	Пт 15.09.17														
12	2.2 Согласование обосновывающих с Заказчиком	10 дней	Пн 18.09.17	Пт 29.09.17														
13	3 Согласование	215 дней	Пн 06.03.17	Пт 29.12.17														
14	3.1 Получение справки о климатических условиях	10 дней	Пн 06.03.17	Пт 17.03.17														
15	3.2 Отчет о центроиде	10 дней	Пн 06.03.17	Пт 17.03.17														
16	3.3 Получение справки о замерных фоновых концентрациях	10 дней	Пн 26.06.17	Пт 07.07.17														
17	3.4 Получение справки о расчетных фоновых концентрациях	10 дней	Пн 26.06.17	Пт 07.07.17														
18	3.5 Публикация объявление о намерениях	5 дней	Пн 07.08.17	Пт 11.08.17														
19	3.6 Получение письма об отсутствии замечаний общественности от местной администрации	10 дней	Пн 11.09.17	Пт 22.09.17														
20	3.7 Оформление инвентаризации для подачи на регистрацию	5 дней	Пн 07.08.17	Пт 11.08.17														
21	3.8 Регистрация инвентаризации в Минприроды	30 дней	Пн 14.08.17	Пт 22.09.17														
22	3.9 Оформление обосновывающих документов для подачи	5 дней	Пн 02.10.17	Пт 06.10.17														
23	3.10 Проведение экспертизы раздела СЗЗ в СЭС	30 дней	Пн 09.10.17	Пт 17.11.17														
24	3.11 Согласование Минприроды или ОГА	30 дней	Пн 20.11.17	Пт 29.12.17														
