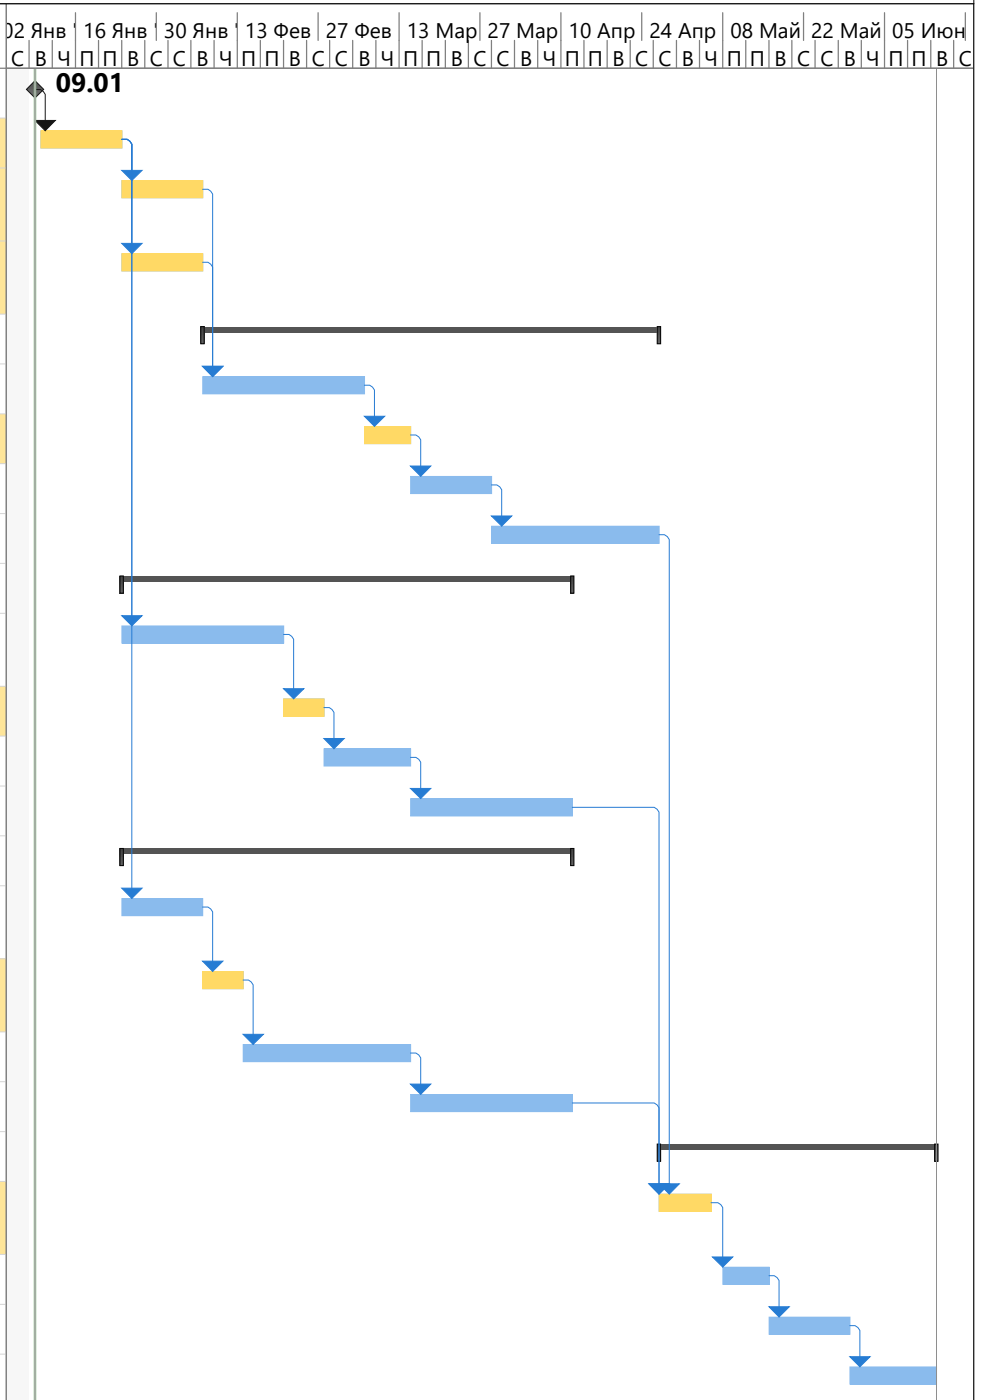


Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	02 Янв 16 Янв 30 Янв 13 Фев 27 Фев 13 Мар 27 Мар 10 Апр 24 Апр 08 Май 22 Май 05 Июнь																											
					С В Ч П П В С С В Ч П П В С С В Ч П П В С С В Ч П П В С С В Ч П П В С																											
1	1 Стартовая встреча	0 дней	Пн 09.01.17	Пн 09.01.17																												
2	2 Сбор исходных данных	10 дней	Вт 10.01.17	Пн 23.01.17																												
3	3 Согласование исходных данных для ПДС в Департаменте	10 дней	Вт 24.01.17	Пн 06.02.17																												
4	4 Получение справки из управления архитектуры о расположении выпусков	10 дней	Вт 24.01.17	Пн 06.02.17																												
5	5 ПДС	55 дней	Вт 07.02.17	Ср 26.04.17																												
6	5.1 Корректировка проекта ПДС	20 дней	Вт 07.02.17	Пн 06.03.17																												
7	5.2 Согласование документов с Заказчиком	5 дней	Вт 07.03.17	Вт 14.03.17																												
8	5.3 Согласование с ГосПродПотребСлужбой	10 дней	Ср 15.03.17	Вт 28.03.17																												
9	5.4 Согласование с Департаментом ОГА	20 дней	Ср 29.03.17	Ср 26.04.17																												
10	6 Балансовые нормы	55 дней	Вт 24.01.17	Вт 11.04.17																												
11	6.1 Корректировка балансовых норм водоотведения и водопотребления	20 дней	Вт 24.01.17	Пн 20.02.17																												
12	6.2 Согласование норм с Заказчиком	5 дней	Вт 21.02.17	Пн 27.02.17																												
13	6.3 Согласование с ГосВодАгентством	10 дней	Вт 28.02.17	Вт 14.03.17																												
14	6.4 Согласование с Департаментом ОГА	20 дней	Ср 15.03.17	Вт 11.04.17																												
15	7 Индивидуальные технологические нормативы	55 дней	Вт 24.01.17	Вт 11.04.17																												
16	7.1 Корректировка индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды	10 дней	Вт 24.01.17	Пн 06.02.17																												
17	7.2 Согласование технологических нормативов с Заказчиком	5 дней	Вт 07.02.17	Пн 13.02.17																												
18	7.3 Согласование с ГосВодАгентством	20 дней	Вт 14.02.17	Вт 14.03.17																												
19	7.4 Согласование с Департаментом ОГА	20 дней	Ср 15.03.17	Вт 11.04.17																												
20	8 Разрешение СВП	30 дней	Чт 27.04.17	Вт 13.06.17																												
21	8.1 Оформление пакета документов для подачи в Разрешительный центр	5 дней	Чт 27.04.17	Пт 05.05.17																												
22	8.2 Подача документов в Разрешительный центр	5 дней	Пн 08.05.17	Пн 15.05.17																												
23	8.3 Получение вывода ГосВодАгентства	10 дней	Вт 16.05.17	Пн 29.05.17																												
24	8.4 Получение разрешения на спецводопользование	10 дней	Вт 30.05.17	Вт 13.06.17																												
